



LECCIÓN 5: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INICIO

Ingeniería Informática



AGENDA

- ◎ Planificación de un proyecto
 - ◎ Acta de Constitución de Proyecto
 - ◎ Plan de Gestión de Proyecto
 - ◎ Gestión de Interesados



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring & Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Execution	4.4 Monitor and Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control	4.6 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Collect Requirements 5.2 Define Scope 5.3 Create WBS		5.4 Verify Scope 5.5 Control Scope	
6. Project Time Management		6.1 Define Activities 6.2 Sequence Activities 6.3 Estimate Activity Resources 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Estimate Costs 7.2 Determine Budget		7.3 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality	8.2 Perform Quality Assurance	8.3 Perform Quality Control	
9. Project Human Resource Management		9.1 Develop Human Resource Plan	9.2 Acquire Project Team 9.3 Develop Project Team 9.4 Manage Project Team		
10. Project Communications Management	10.1 Identify Stakeholders	10.2 Plan Communications	10.3 Distribute Information 10.4 Manage Stakeholder Expectations	10.5 Report Performance	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Risk Qualitative Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses		11.6 Monitor and Control Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurements	12.2 Conduct Procurements	12.3 Administer Procurements	12.4 Close Procurements



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

⊙ Procesos de Integración, Alcance y Tiempo

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring & Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Execution	4.4 Monitor and Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control	4.6 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Collect Requirements 5.2 Define Scope 5.3 Create WBS		5.4 Verify Scope 5.5 Control Scope	
6. Project Time Management		6.1 Define Activities 6.2 Sequence Activities 6.3 Estimate Activity Resources 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

⦿ Procesos de Costo, Calidad y Recursos Humanos

7. Project Cost Management		7.1 Estimate Costs 7.2 Determine Budget		7.3 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality	8.2 Perform Quality Assurance	8.3 Perform Quality Control	
9. Project Human Resource Management		9.1 Develop Human Resource Plan	9.2 Acquire Project Team 9.3 Develop Project Team 9.4 Manage Project Team		



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

⊙ Procesos de Comunicaciones, Riesgo y Proveedores

10. Project Communications Management	10.1 Identify Stakeholders	10.2 Plan Communications	10.3 Distribute Information 10.4 Manage Stakeholder Expectations	10.5 Report Performance	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses		11.6 Monitor and Control Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurements	12.2 Conduct Procurements	12.3 Administer Procurements	12.4 Close Procurements




PROCESOS DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

- Procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la Dirección de Proyectos



PROCESOS DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO


- ◎ Acta de Constitución del Proyecto
 - ◎ Formalización del proyecto.
 - ◎ Autoridad al director para ejercer la dirección.
 - ◎ Patrocinador o iniciador puede realizar el acta de constitución.

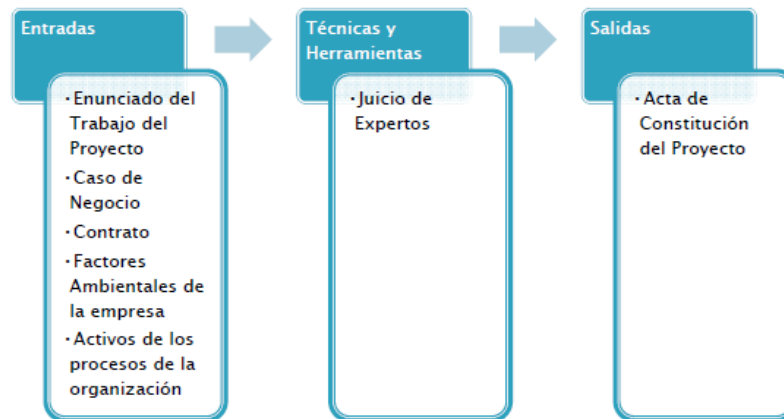

PROCESOS DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

⊙ Plan de Dirección del Proyecto

- ⊙ Proceso que documenta las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. Fuente primaria de información.

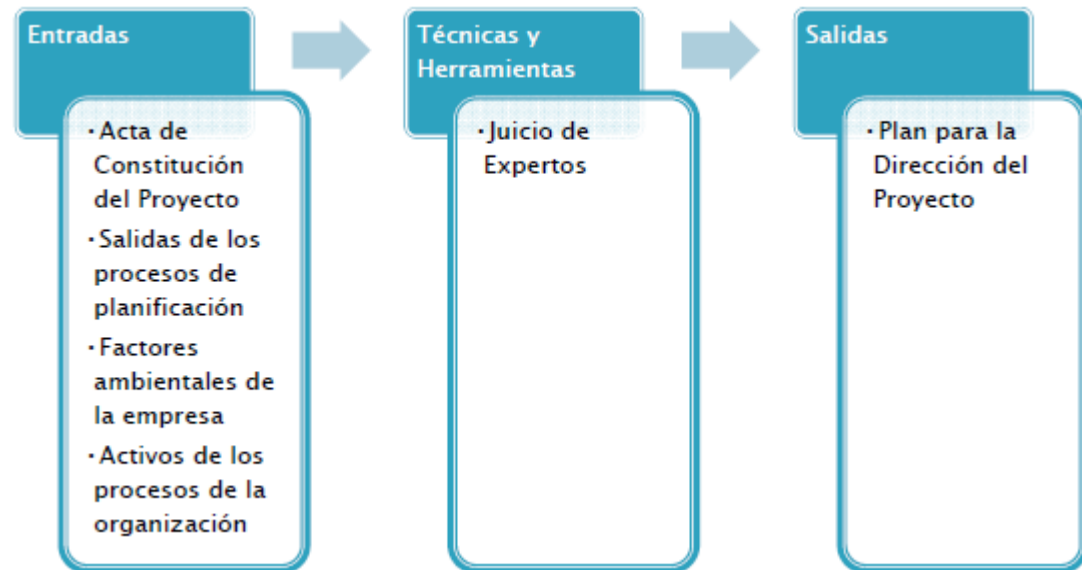

ENTREGABLE 5.1

- ⦿ Para la idea de proyecto que han venido desarrollando.
- ⦿ Completar el formato de Acta de Constitución del Proyecto.




GESTIÓN DE INTERESADOS

- ⊙ Stakeholder
- ⊙ Son todos aquellos con interés e influencia sobre el proyecto.



GESTIÓN DE INTERESADOS

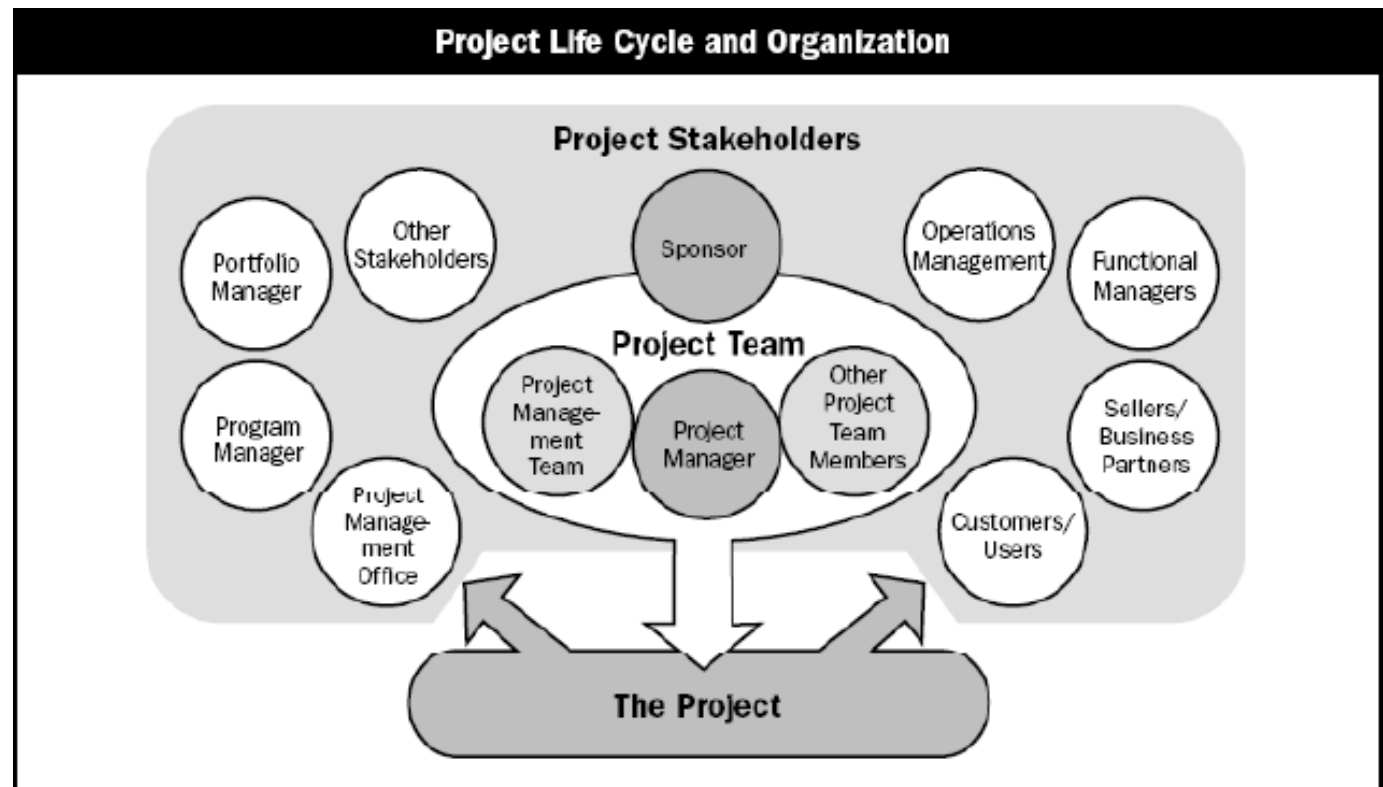


MATRIZ PODER - INTERÉS

	Grado	Valor
Poder	Muy alto	2
	Alto	1
	Medio	0
	Bajo	-1
	Muy bajo	-2
Interés	Muy alto	2
	Alto	1
	Medio	0
	Bajo	-1
	Muy bajo	-2

Interesado	Código	Interés	Poder
Socios	A	2	2
Colaboradores o Empleados	B	2	0
Equipo de Proyecto	C	2	2
Director de Proyecto	D	2	2
Gerente de la empresa	E	2	2
Clientes	F	2	0
Proveedores	G	1	0
Subcontratista	H	1	0
Familias de empleados	I	0	-2
Consultores	J	1	-1
Gobierno	K	-1	-1

Relación Interés - Poder

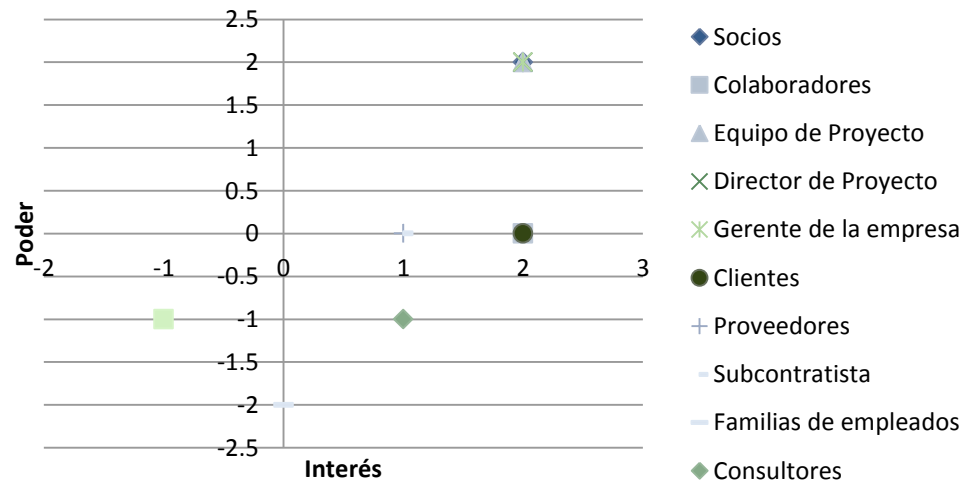

MATRIZ PODER - INTERÉS

Relationships:
- direct only

	CUS1: Facturar Entrega Pedido	CUS2: Cobro Clientes	CUS3: Compra a Proveedores	CUS4: Confeccionar Catálogo	CUS5: Consultar Pedidos no Atendidos	CUS6: Control Estadísticas	CUS7: Consultar Catálogo	CUS8: Entrevista Trabajo	CUS9: Gestión Nóminas	CUS10: Gestión de Personal	CUS11: Gestión de Regiones	CUS12: Otorgar Incentivos	CUS13: Política de Ventas	CUS14: Reabastecer Almacén	CUS15: Realizar Oferta	CUS16: Redistribución de Personal	CUS17: Atender Pedido	CUS18: Cancelar Pedido Atendido	CUS19: Consultar Pedidos a Enviar	CUS20: Elaborar Pedido	CUS21: Elaborar Pedido On-line	CUS22: Gestión de Clientes	CUS23: Incidencia Pedido	CUS24: Introducir Recibos	CUS25: Pasar Pedido a Envío	CUS26: Realizar Envío	CUS27: Reposición de Stock
ACT1: Ingeniero de Logística																											
ACT2: Jefe de Almacén																											
ACT3: Técnico de Almacén																											
ACT4: Representante de Ventas																											
ACT5: Jefe de Ventas																											
ACT6: Contable																											
ACT7: Empleado de Marketing																											
ACT8: Cliente Online																											
ACT9: Operadora																											
ACT10: Encargado de Transporte																											
ACT11: Empleado de Recursos Humanos																											
ACT12: Jefe de Recursos Humanos																											



ENTREGABLE 5.2

- ◎ Para el proyecto que definió realizar lo siguiente:
 - ◎ Identificación de los interesados.
 - ◎ Clasificarlos
 - ◎ Establecer una matriz de poder – interés
 - ◎ Usar los formatos que se adjuntan en la documentación

