



LECCIÓN 6: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ALCANCE

Ingeniería Informática



AGENDA


- ① Planificación de un proyecto
 - ② Definición del Alcance de un proyecto
 - ③ EDT



PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

- Definir los límites del trabajo, que hacer y que no hacer.
- Todos los procesos que permitan garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito.


- Alcance del producto
- Alcance del proyecto

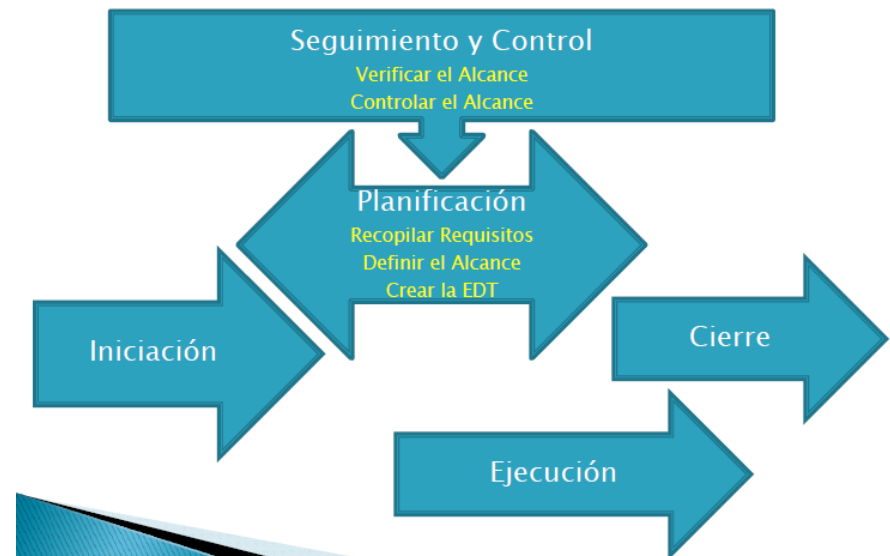

PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Recopilar Requisitos

- Proceso para documentar y definir las necesidades de los interesados, expectativas del patrocinador, cliente y otras partes interesadas.
- Influye en procesos siguientes.

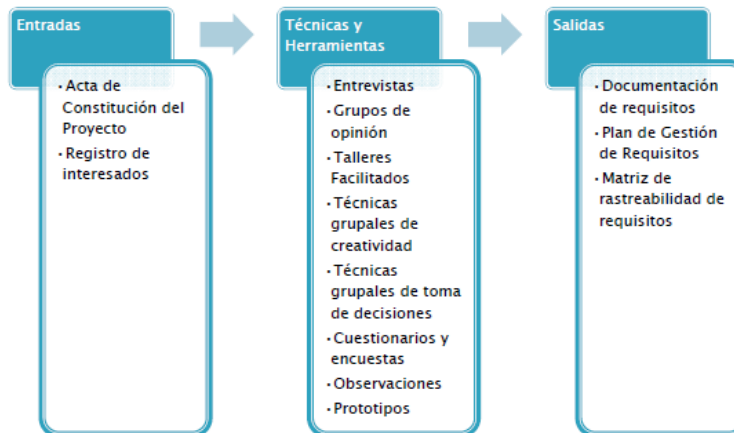

Requerimiento	Prioridad	Estado	Dificultad	Asignado a
CUS1: Facturar Entrego Pedido	Baja	Propuesto	Medio	
CUS2: Cobro Clientes	Baja	Propuesto	Medio	
CUS3: Compra o Proveedores	Medio	Aprobado	Medio	
CUS4: Confeccionar Catálogo	Medio	Aprobado	Medio	
CUS5: Consultar Pedidos no Atendidos	Alta	Validado	Baja	José A. Mochofi, Eduardo Bueno
CUS6: Control Estadísticas	Medio	Aprobado	Medio	
CUS7: Consultar Catálogo	Medio	Aprobado	Medio	
CUS8: Entrevista Trabajo	Baja	Propuesto	Baja	
CUS9: Gestión Nóminas	Medio	Aprobado	Medio	
CUS10: Gestión de Personal	Baja	Propuesto	Medio	
CUS11: Gestión de Regiones	Medio	Aprobado	Medio	
CUS12: Otorgar Incentivos	Baja	Propuesto	Baja	
CUS13: Política de Ventas	Baja	Propuesto	Baja	
CUS14: Reabastecer Almacén	Medio	Aprobado	Medio	
CUS15: Realizar Oferta	Medio	Aprobado	Medio	
CUS16: Redistribución de Personal	Medio	Aprobado	Medio	
CUS17: Atender Pedido	Alta	Incorporado	Medio	José Antonio Mochofi
CUS18: Cancelar Pedido Atendido	Alta	Incorporado	Medio	Eduardo Bueno Medina
CUS19: Consultar Pedidos o Enviar	Alta	Incorporado	Baja	Germán Mira Rico
CUS20: Elaborar Pedido	Alta	Validado	Alta	Germán Mira y José A. Mochofi
CUS21: Elaborar Pedido On-line	Medio	Aprobado	Alta	
CUS22: Gestión de Clientes	Medio	Aprobado	Medio	
CUS23: Incidencia Pedido	Medio	Incorporado	Medio	César López Rodríguez
CUS24: Iniciar Pedido	Baja	Aprobado	Medio	
CUS25: Pasar Pedido a Envío	Alta	Incorporado	Medio	Germán Mira Rico
CUS26: Realizar Envío	Medio	Aprobado	Medio	
CUS27: Reposición de Stock	Medio	Aprobado	Medio	
* <Click here to create a requirement>	Medio	Aprobado	Medio	



PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Definir el alcance

- Proceso para elaborar una descripción detallada del proyecto y del producto o resultado esperado. Toma en cuenta los requisitos, hipótesis, supuestos, limitantes y riesgos iniciales.



ENTREGABLE 5.3

- © Para el proyecto que definió en la actividad 2.1, deben elaborar la matriz de rastreabilidad preliminar y el enunciado del alcance en el formato que se les brinda.



PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE


⊙ Estructura Detallada de Trabajo

- ⊙ Consiste en dividir el trabajo en unidades o componentes más pequeños y manejables.
- ⊙ Descomposición jerárquica del trabajo.
- ⊙ Niveles más bajos son paquetes de trabajo.



PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

En algunos casos en el 2do nivel de la EDT se indican las fases del ciclo de vida y en el 3er nivel los productos entregables.

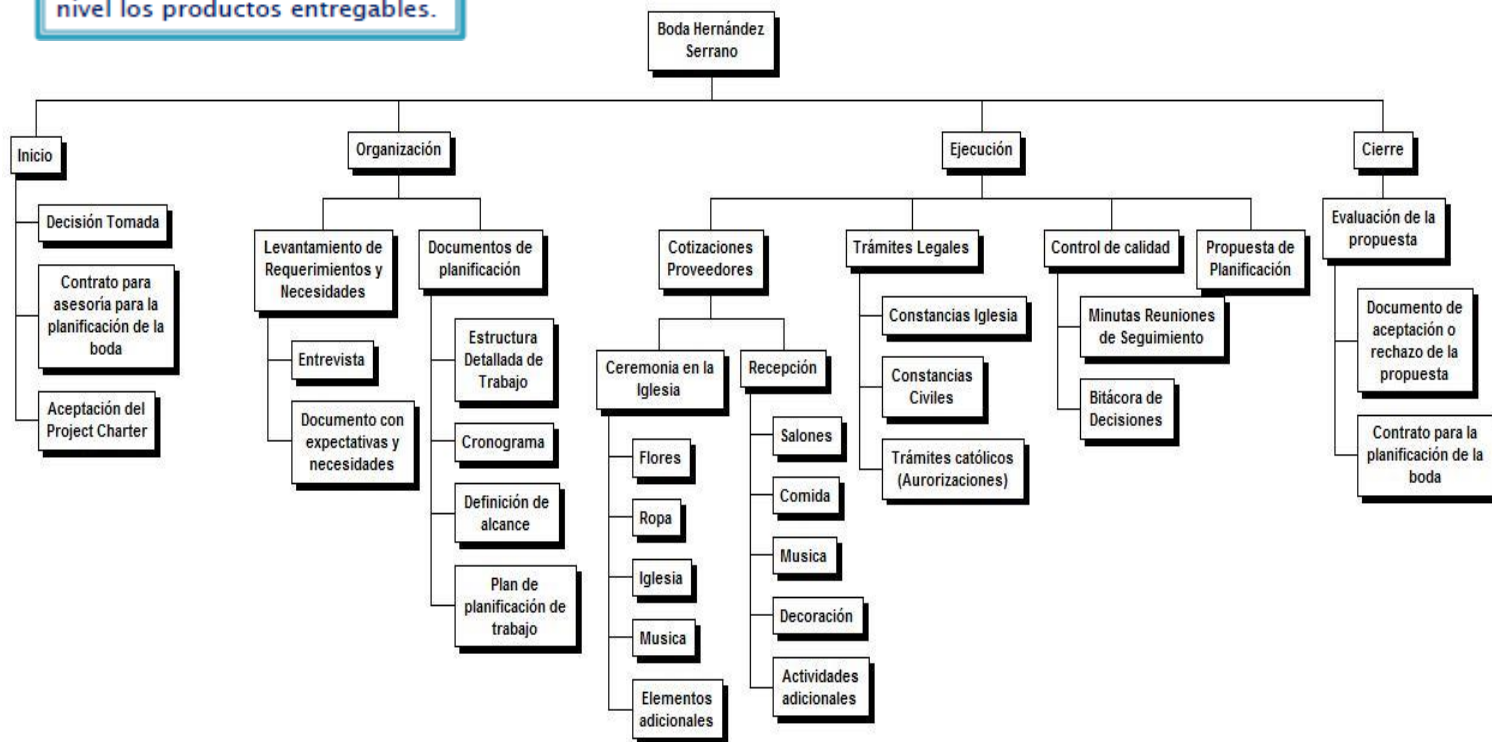

PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

⦿ Diccionario de la EDT

- ⦿ Documento que se genera en el proceso de creación de la EDT.


DICCIONARIO DE EDT (WBS)					
Cuenta de control:		Desarrollo			
Identificador del Entregable:		2.3			
Nombre de entregable(s):		Seleccionar Cotizaciones			
Alcance del Trabajo:		Implementar Formulario. Implementar lógica del negocio.			
Responsable:		Programador 2			
Duración estimada:	4 días	Fecha de Inicio:	05/08/2009	Fecha de Término:	10/08/2009
Requisitos de calidad:		Información completa y correcta por cada clase : • A qué tipo de Capa pertenece • Autor de la clase • Fecha de Inicio de la codificación de la clase • Autor del clase • Versión del clase			
Otras referencias:		Estándares de código			
Hitos del cronograma:		Cierre de Desarrollo			



PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

- ◎ Línea Base del Proyecto
 - Enunciado del Alcance
 - EDT o WBS
 - Diccionario de la EDT

Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia
al 30 de diciembre de 2009*

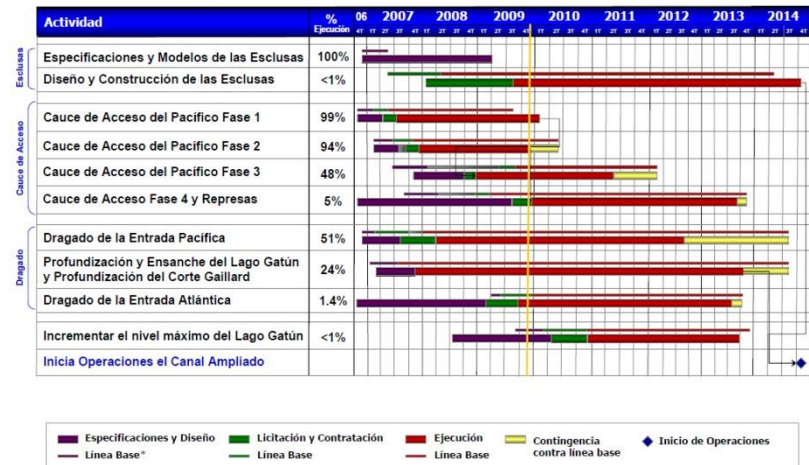

* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia





ENTREGABLE 5.4

- ⦿ Para el proyecto que definió deben elaborar
 - ⦿ La Estructura Detallada del trabajo
 - ⦿ Par de ejemplos en el diccionario de la EDT según los formatos entregados.




PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

🎯 Verificar el alcance

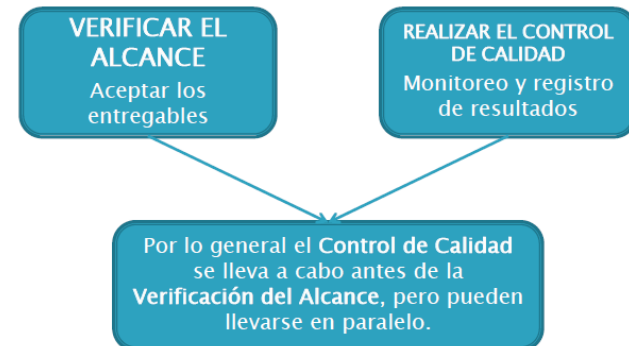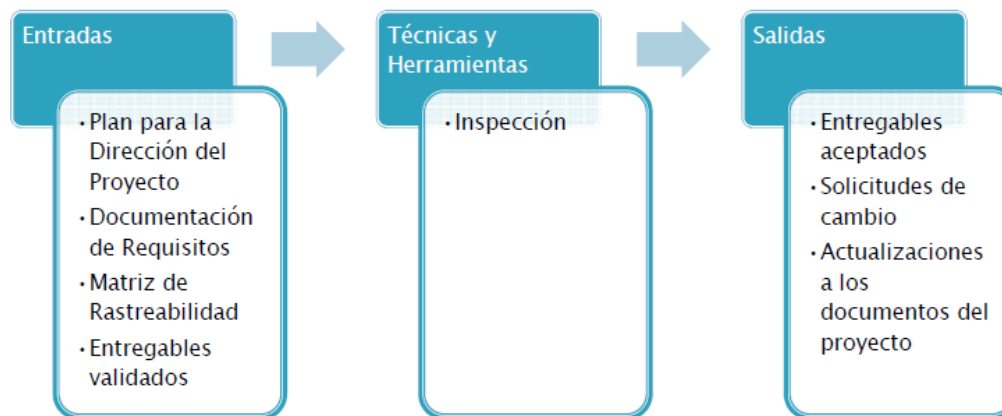


PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

⦿ Controlar el alcance

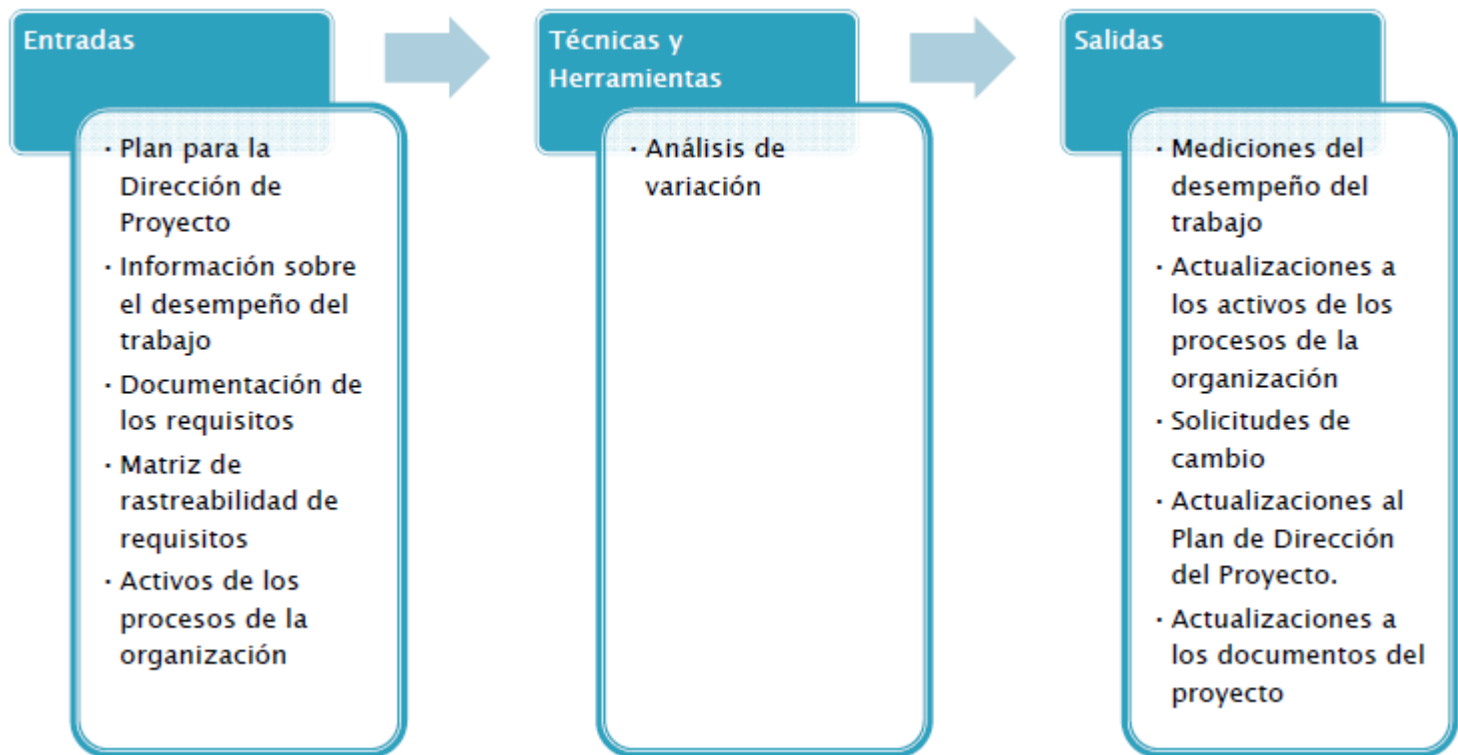

INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL ALCANCE

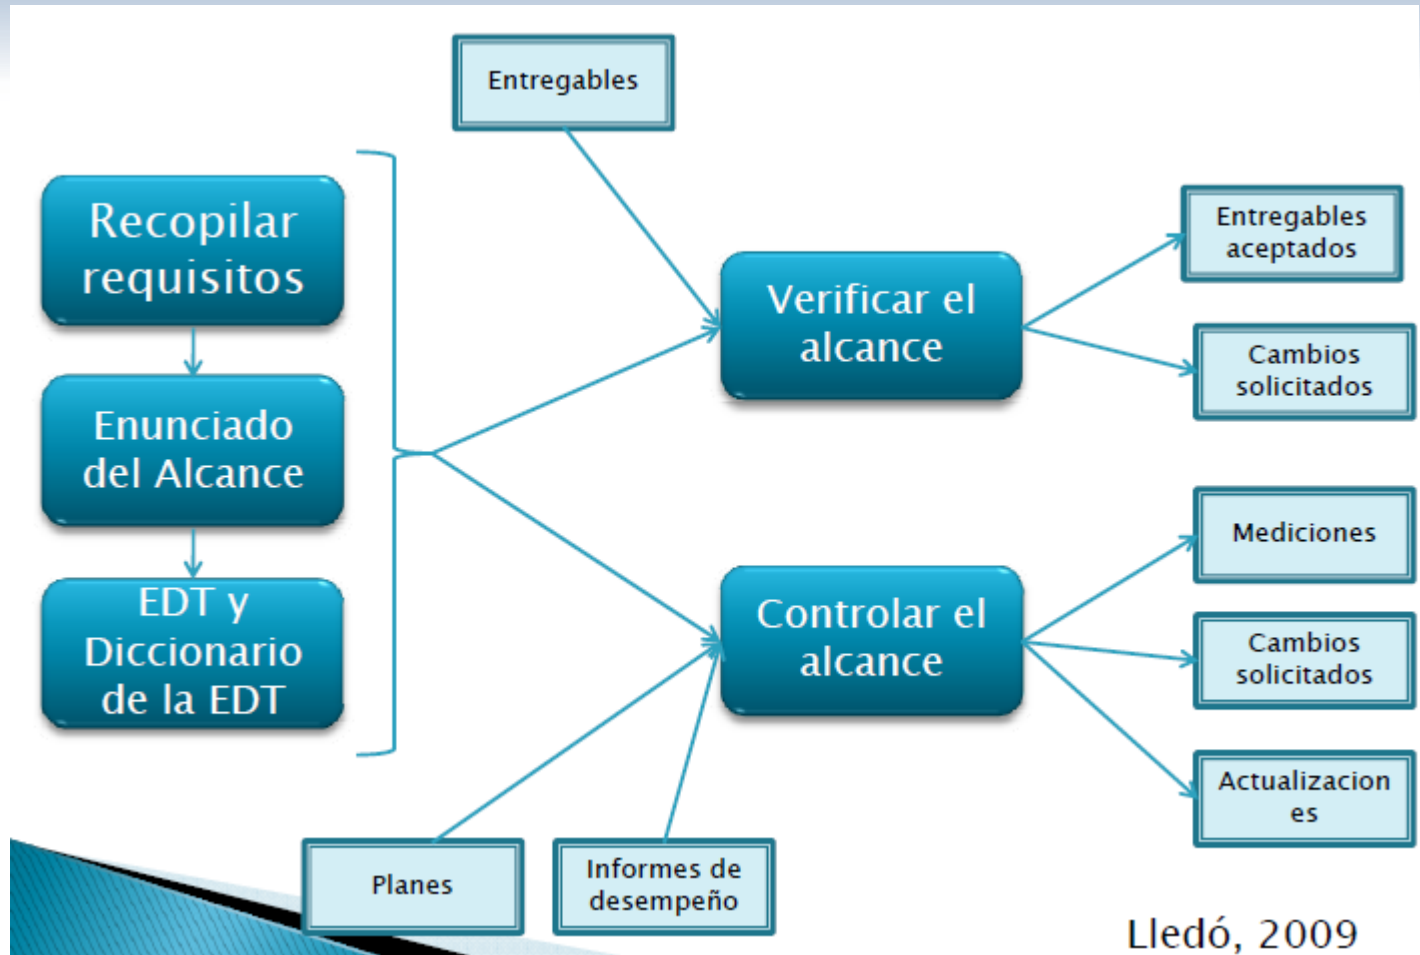

Lledó, 2009



ENTREGABLE 5.5

- ⦿ Para el proyecto que definió deben elaborar
 - ⦿ El enunciado del alcance.

