



LECCIÓN 10: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS RECURSOS HUMANOS

Ingeniería Informática



AGENDA

- ① Gestión de Recursos Humanos
 - ② Adquisición de Personal
 - ② Perfiles de personal




DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DEL DIRECTOR DE PROYECTO



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

🎯 Etapas trabajo en equipo

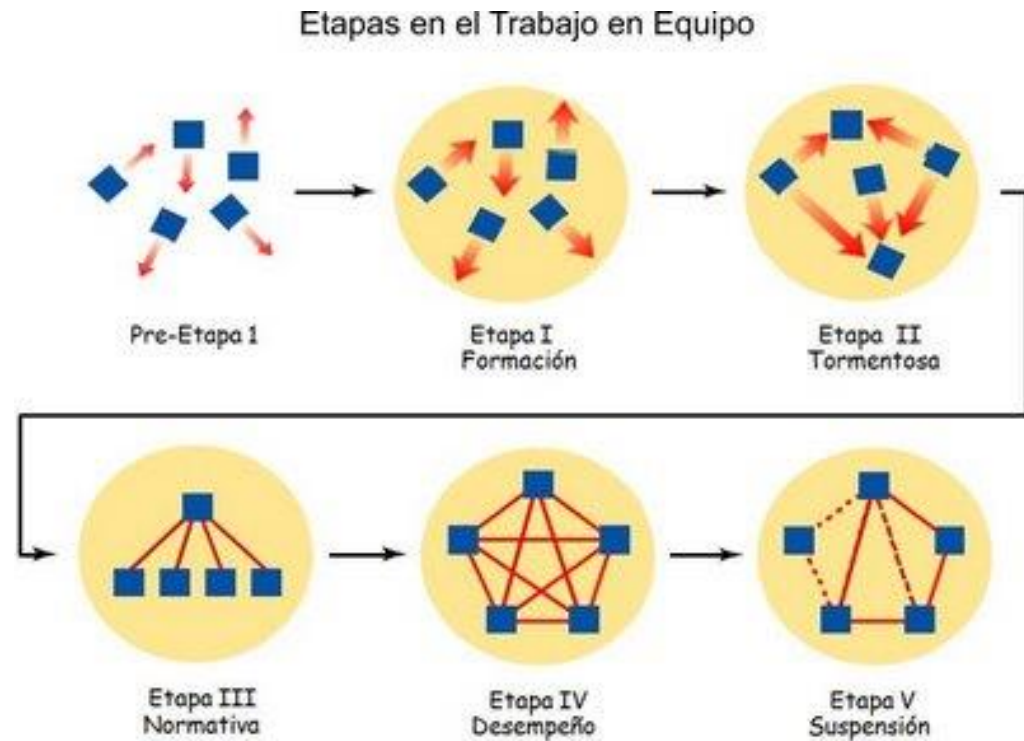


GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

- Equipo de Proyecto y Equipo Director de Proyecto




GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

- Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de proyecto.

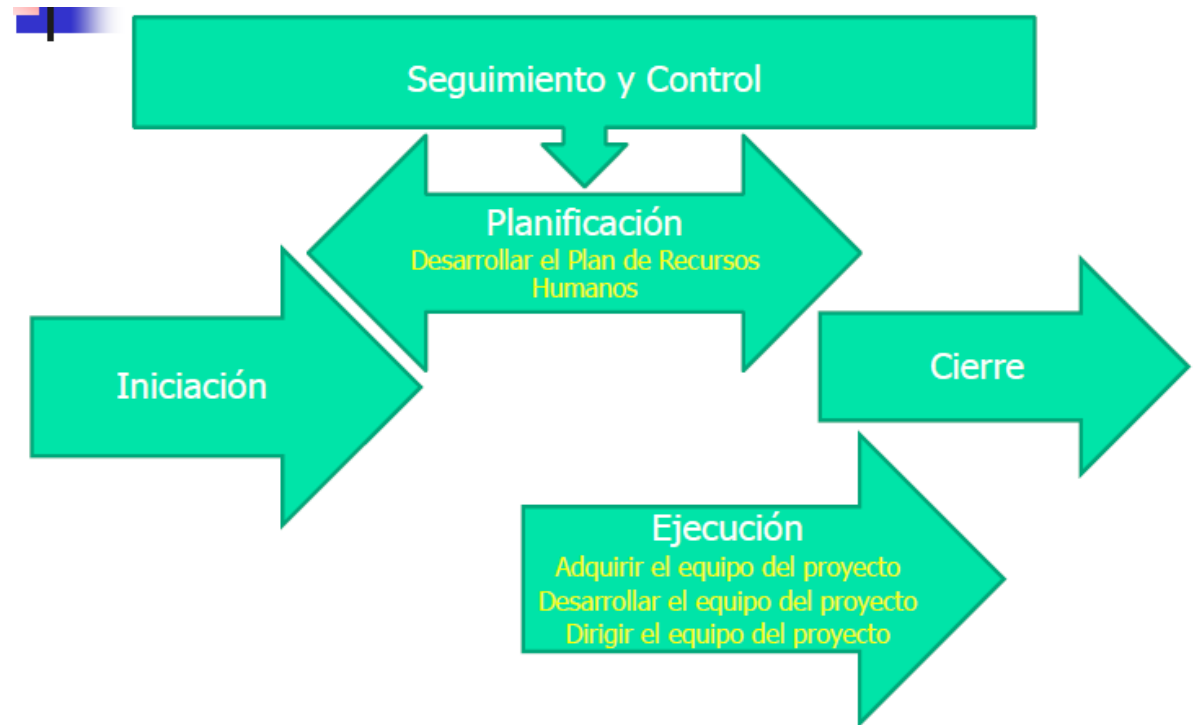


GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

⊙ Desarrollar el plan del recurso humano

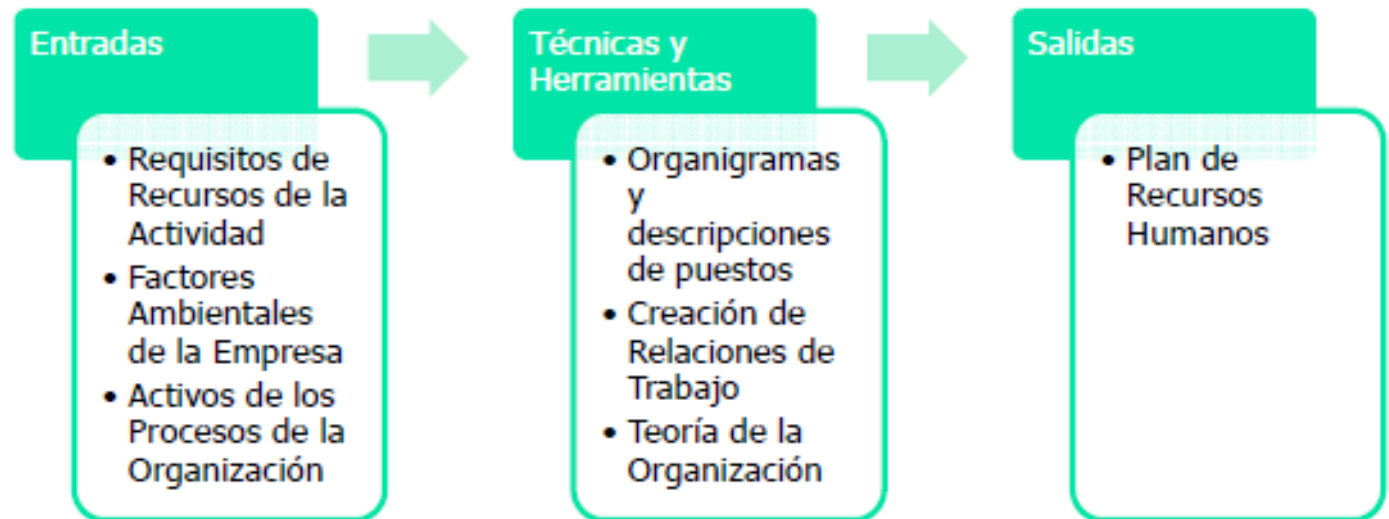

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

⊙ Estructura de Desglose de Recursos

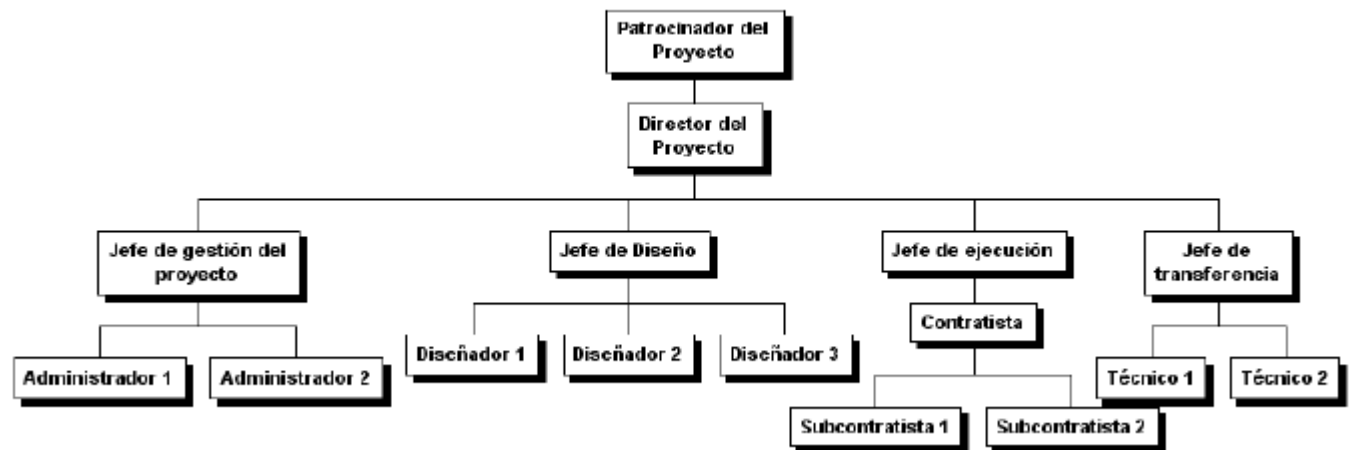

PERFIL DEL RECURSO HUMANO

Función dentro del Proyecto	
Director de Construcción	
Formación Académica	Conocimientos
Ingeniero Civil o en Construcción	Idioma Inglés (intermedio)
Maestría en Gerencia de Proyectos	MS Project (avanzado)
Experiencia	Técnicas de negociación
5 años de experiencia en la gerencia de proyectos de construcción	Legislación laboral y ambiental vigente en el país para procesos de construcción
Experiencia en construcción de obras mayores a 3000 m2	Habilidades
Miembro activo del colegio profesional respectivo	Capacidad para resolver problemas
	Proactivo
	Capacidad para trabajar bajo presión
	Liderazgo
	Empatía
	Organizado
	Trabajo en equipo
Roles y Responsabilidades	
Elaborar los procedimientos y planes en materia de construcción relacionados con la creación del Área de Construcción de la empresa.	
Gestionar, administrar, dirigir y apoyar los procesos de construcción de cada uno de los proyectos.	
Coordinar y gestionar las sub áreas de apoyo de la Dirección de Construcción (Ambiental, Seguridad Ocupacional, Proveeduría y Programación y Control)	
Elaborar informes mensuales a los patrocinadores, clientes, gerentes y socios de la empresa.	



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

⊙ Matriz RACI

Diagrama RACI	Persona				
Actividad	Ana	Benito	Carlos	Dina	Eduardo
Definir	A	R	I	I	I
Diseñar	I	A	R	C	C
Desarrollar	I	A	R	C	C
Probar	A	I	I	R	I

R = Persona Responsable A = Persona que Rinde Cuentas C = Persona Consultada I = Persona Informada



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

◎ Plan de Recursos Humanos




EJERCICIO 5.6

- ⊙ Para el proyecto que definió en la actividad 2.1,
 - ⊙ Elaborar el perfil de los recursos (Un ejemplo) utilizando el formato que se le brinda.
 - ⊙ Establecer el organigrama del proyecto según formato que se le brinda.
 - ⊙ Establecer la matriz RACI con respecto a las responsabilidades y actividades de cada persona del equipo director de proyecto.
 - ⊙ Formato Organigrama del proyecto
- ⊙ Tiempo 30 minutos.



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

🎯 Adquirir el Equipo de Proyecto

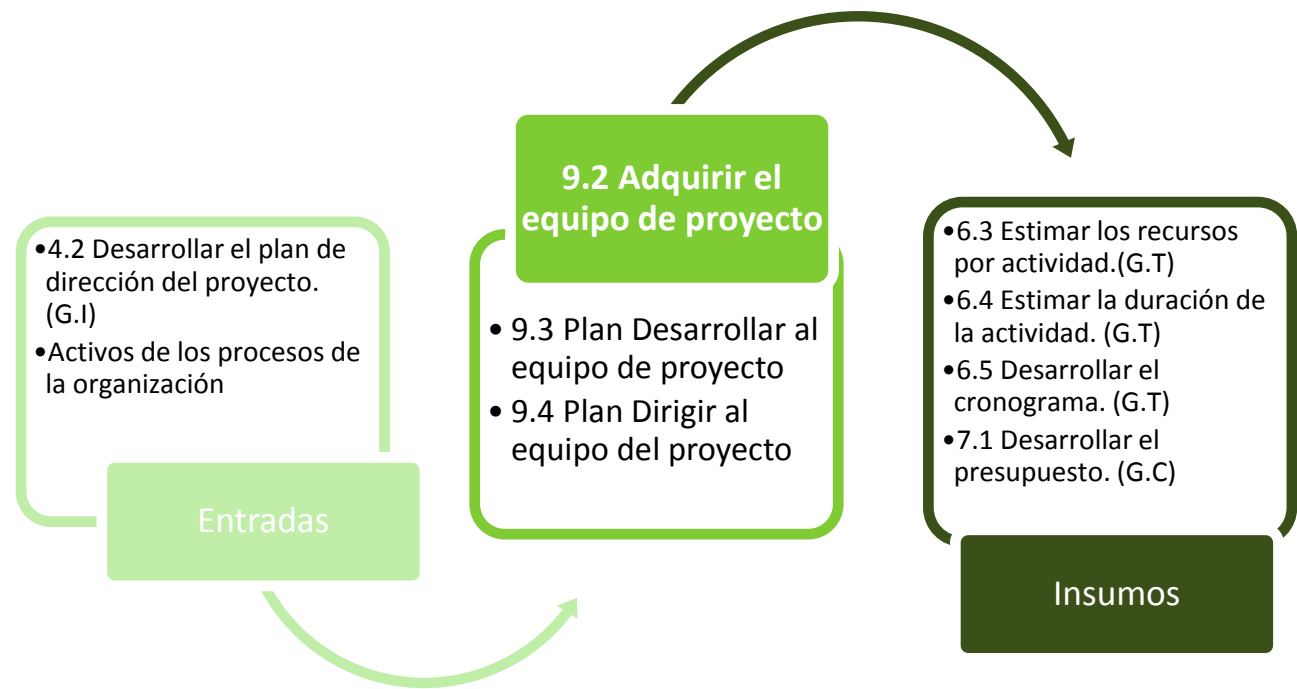

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

⊙ Negociación

Ganar/Ganar

- Negociación satisfactoria
- Obtención de beneficios

Ganar/Perder

- Negociación desbalanceada
- Noveno mes


Perder/Perder

- Negociación fracasada
- Sin beneficios




GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

🎯 Negociación

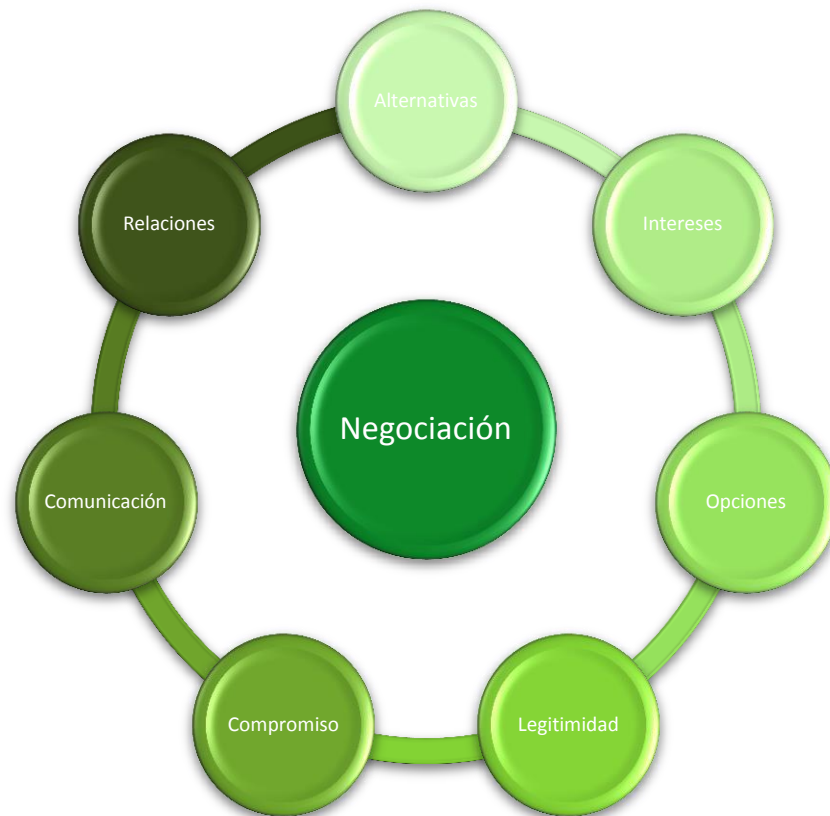

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

🎯 Desarrollar el equipo de Proyecto

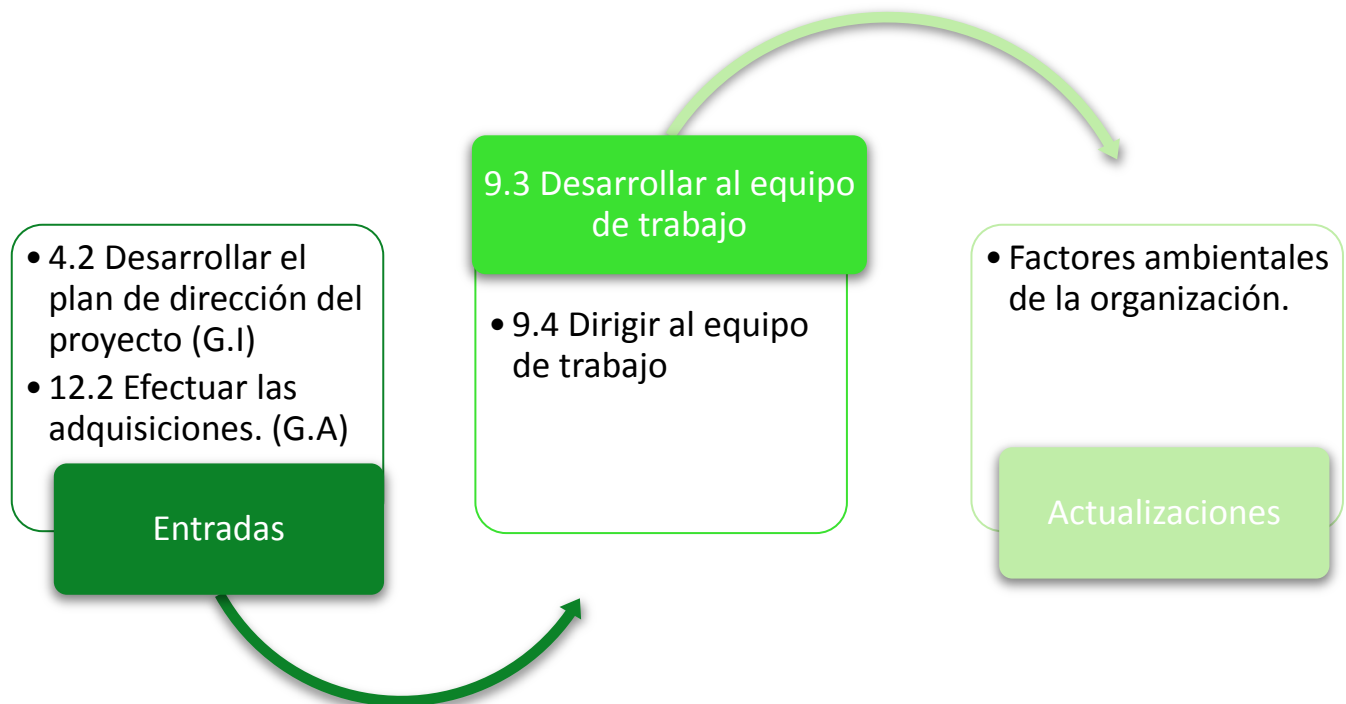

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO


🎯 Plan de Capacitación

Competencia / Roles	Gerente de Proyecto	Director de Construcción	Director Financiero	Director de Control de Calidad	Director Legal	Gestor Ambiental	Encargado de Seguridad Ocupacional	Gestor de Proveedores	Encargado de Programación y Control
Curso de Negociación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Curso de Administración de Recurso Humano	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Curso de Liderazgo, Trabajo en Equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Curso de Expresión escrita y oral	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Curso de Contratación de Administrativa	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
Curso de Normativa Laboral	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Curso de Normativa Constructiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Curso de Normativa ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Curso de Gerencia de Proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

🎯 Dirigir el equipo de proyecto

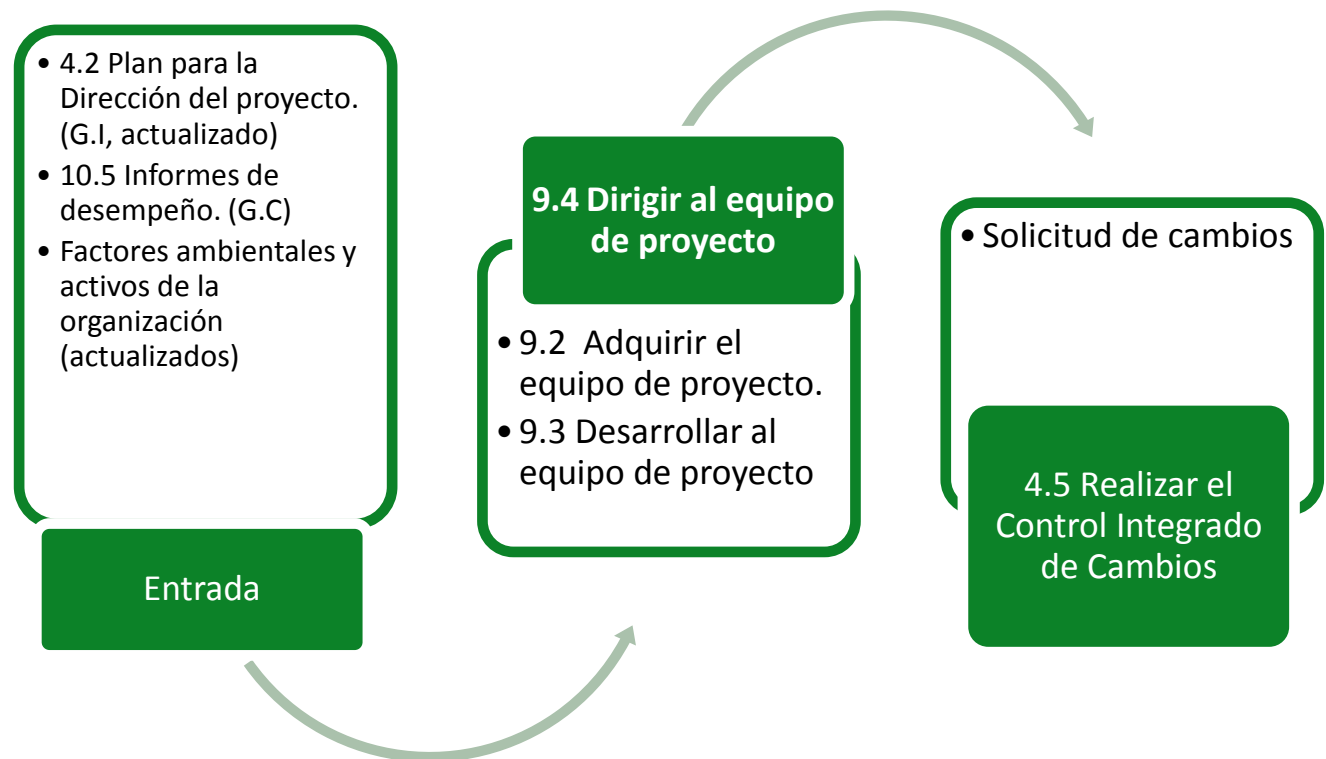

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

⊙ Conflicto en los proyectos

- ⊙ Apartarse / Eludir
- ⊙ Suavizar / Conciliar
- ⊙ Consentir
- ⊙ Forzar
- ⊙ Colaborar
- ⊙ Confrontar / Resolver problemas



EJERCICIO 5.7

- ⦿ Para el proyecto que definió en la actividad 2.1,
 - ⦿ Establecer un plan de capacitación preliminar para el equipo director de proyecto.
- ⦿ Tiempo 20 minutos.



MUCHAS GRACIAS

